

TOIMIVAT UIMAHALLIT -SEMINAARI


HANKKEEN VALMISTELU
JA
VASTAANOTTOVAIHEEN HUOMIOIMINEN

PENTTI PERNU


23.9.2020

HANKKEEN VALMISTELU

FYSIIKAN LAIT

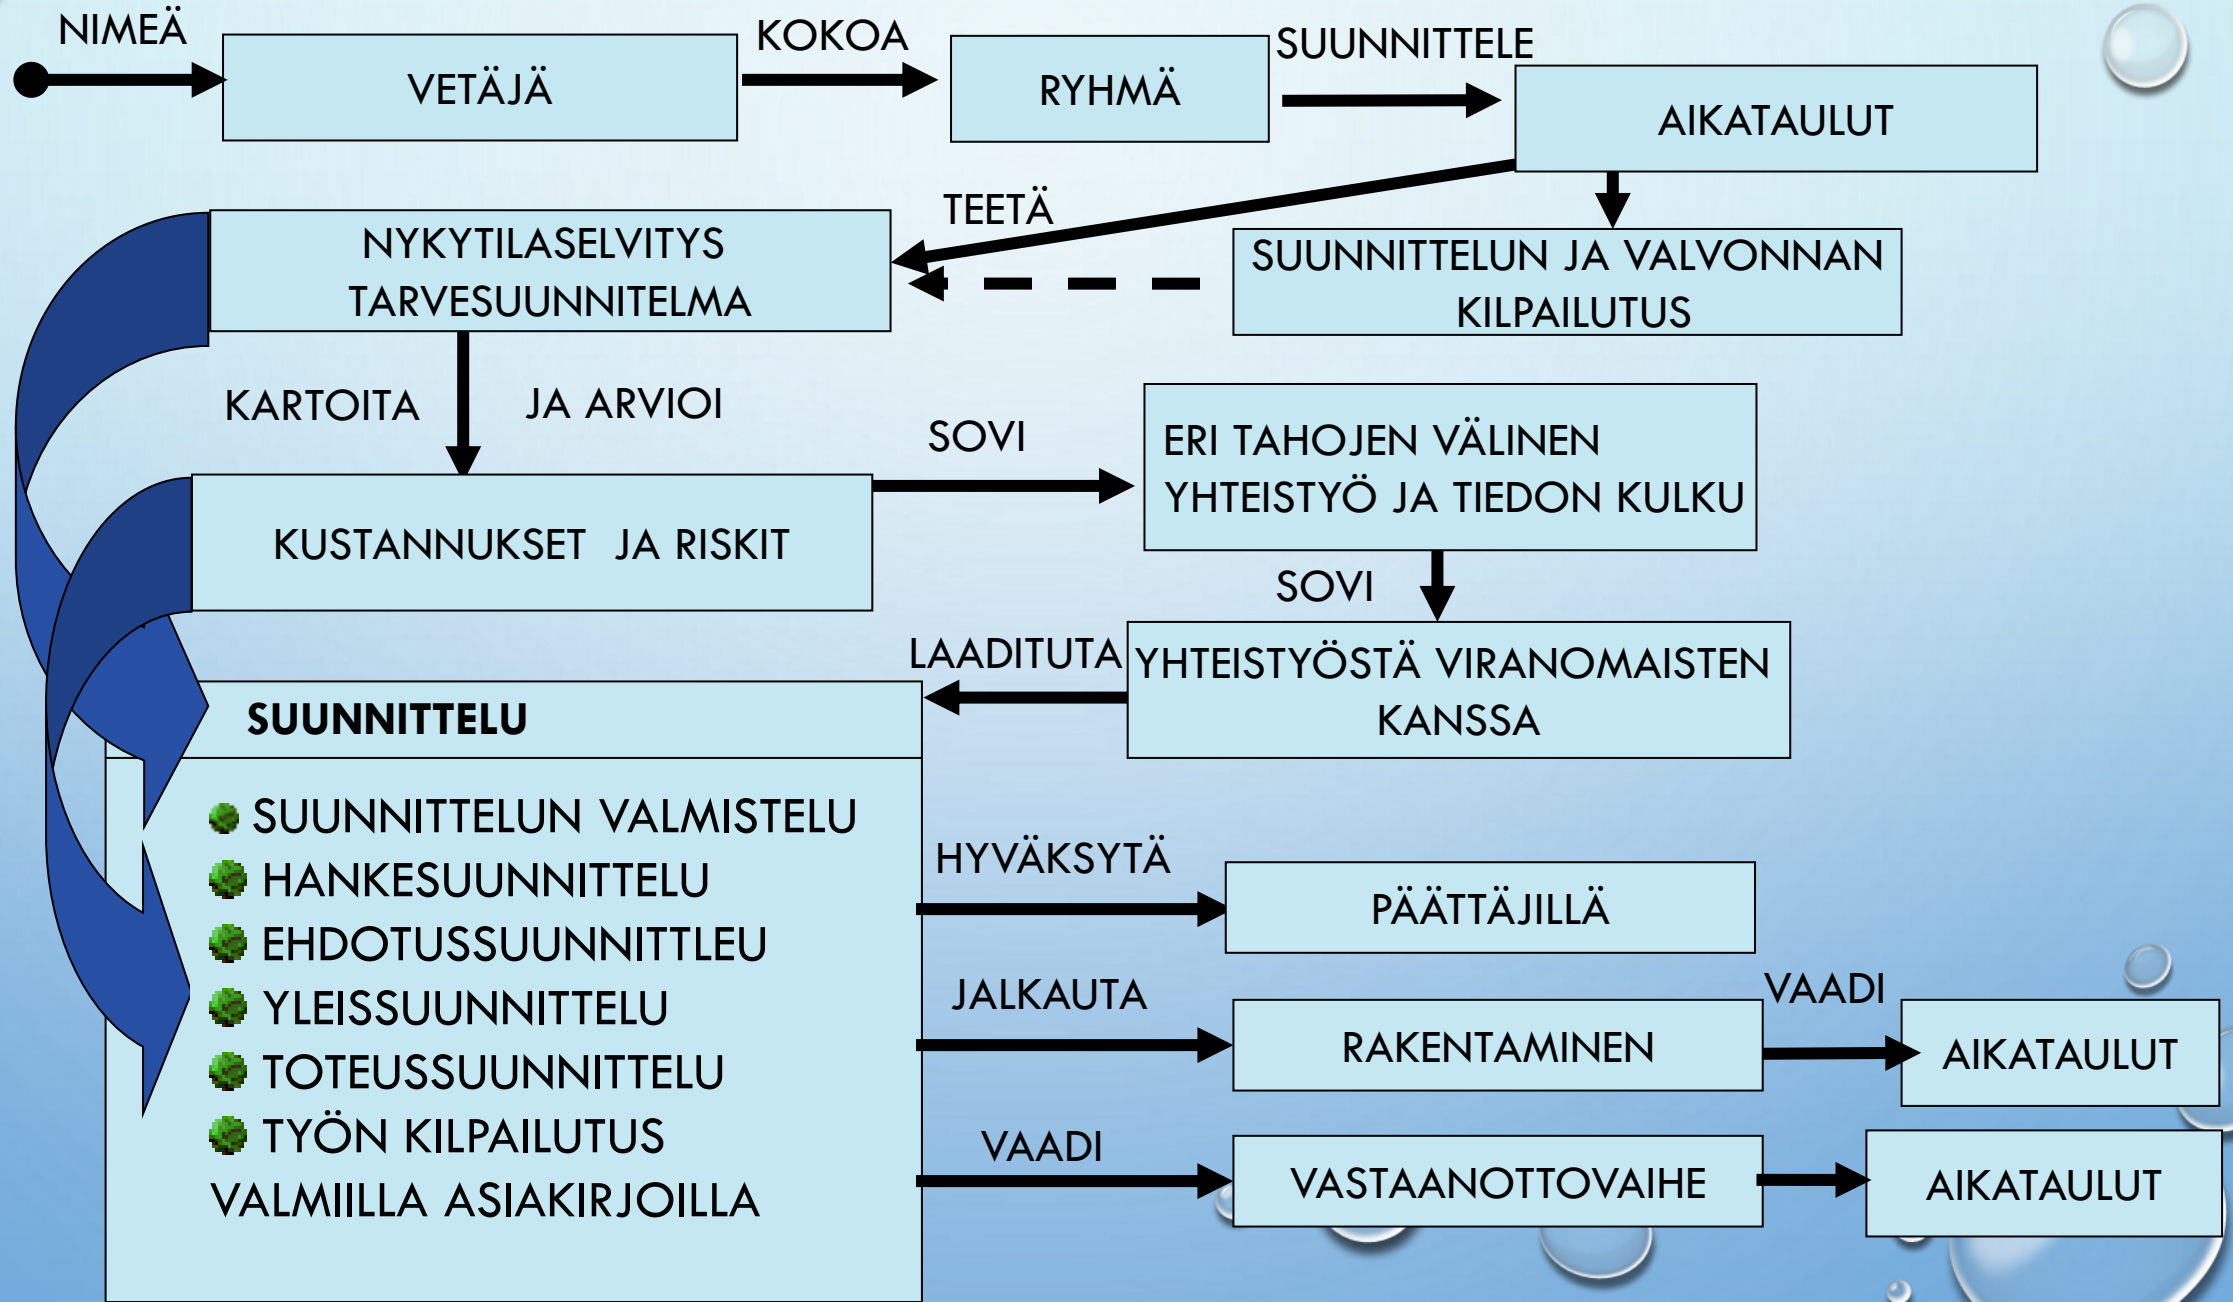

VASTAANOTTOVAIHEEN HUOMIOIMINEN UIMAHALLIHANKKEESSA

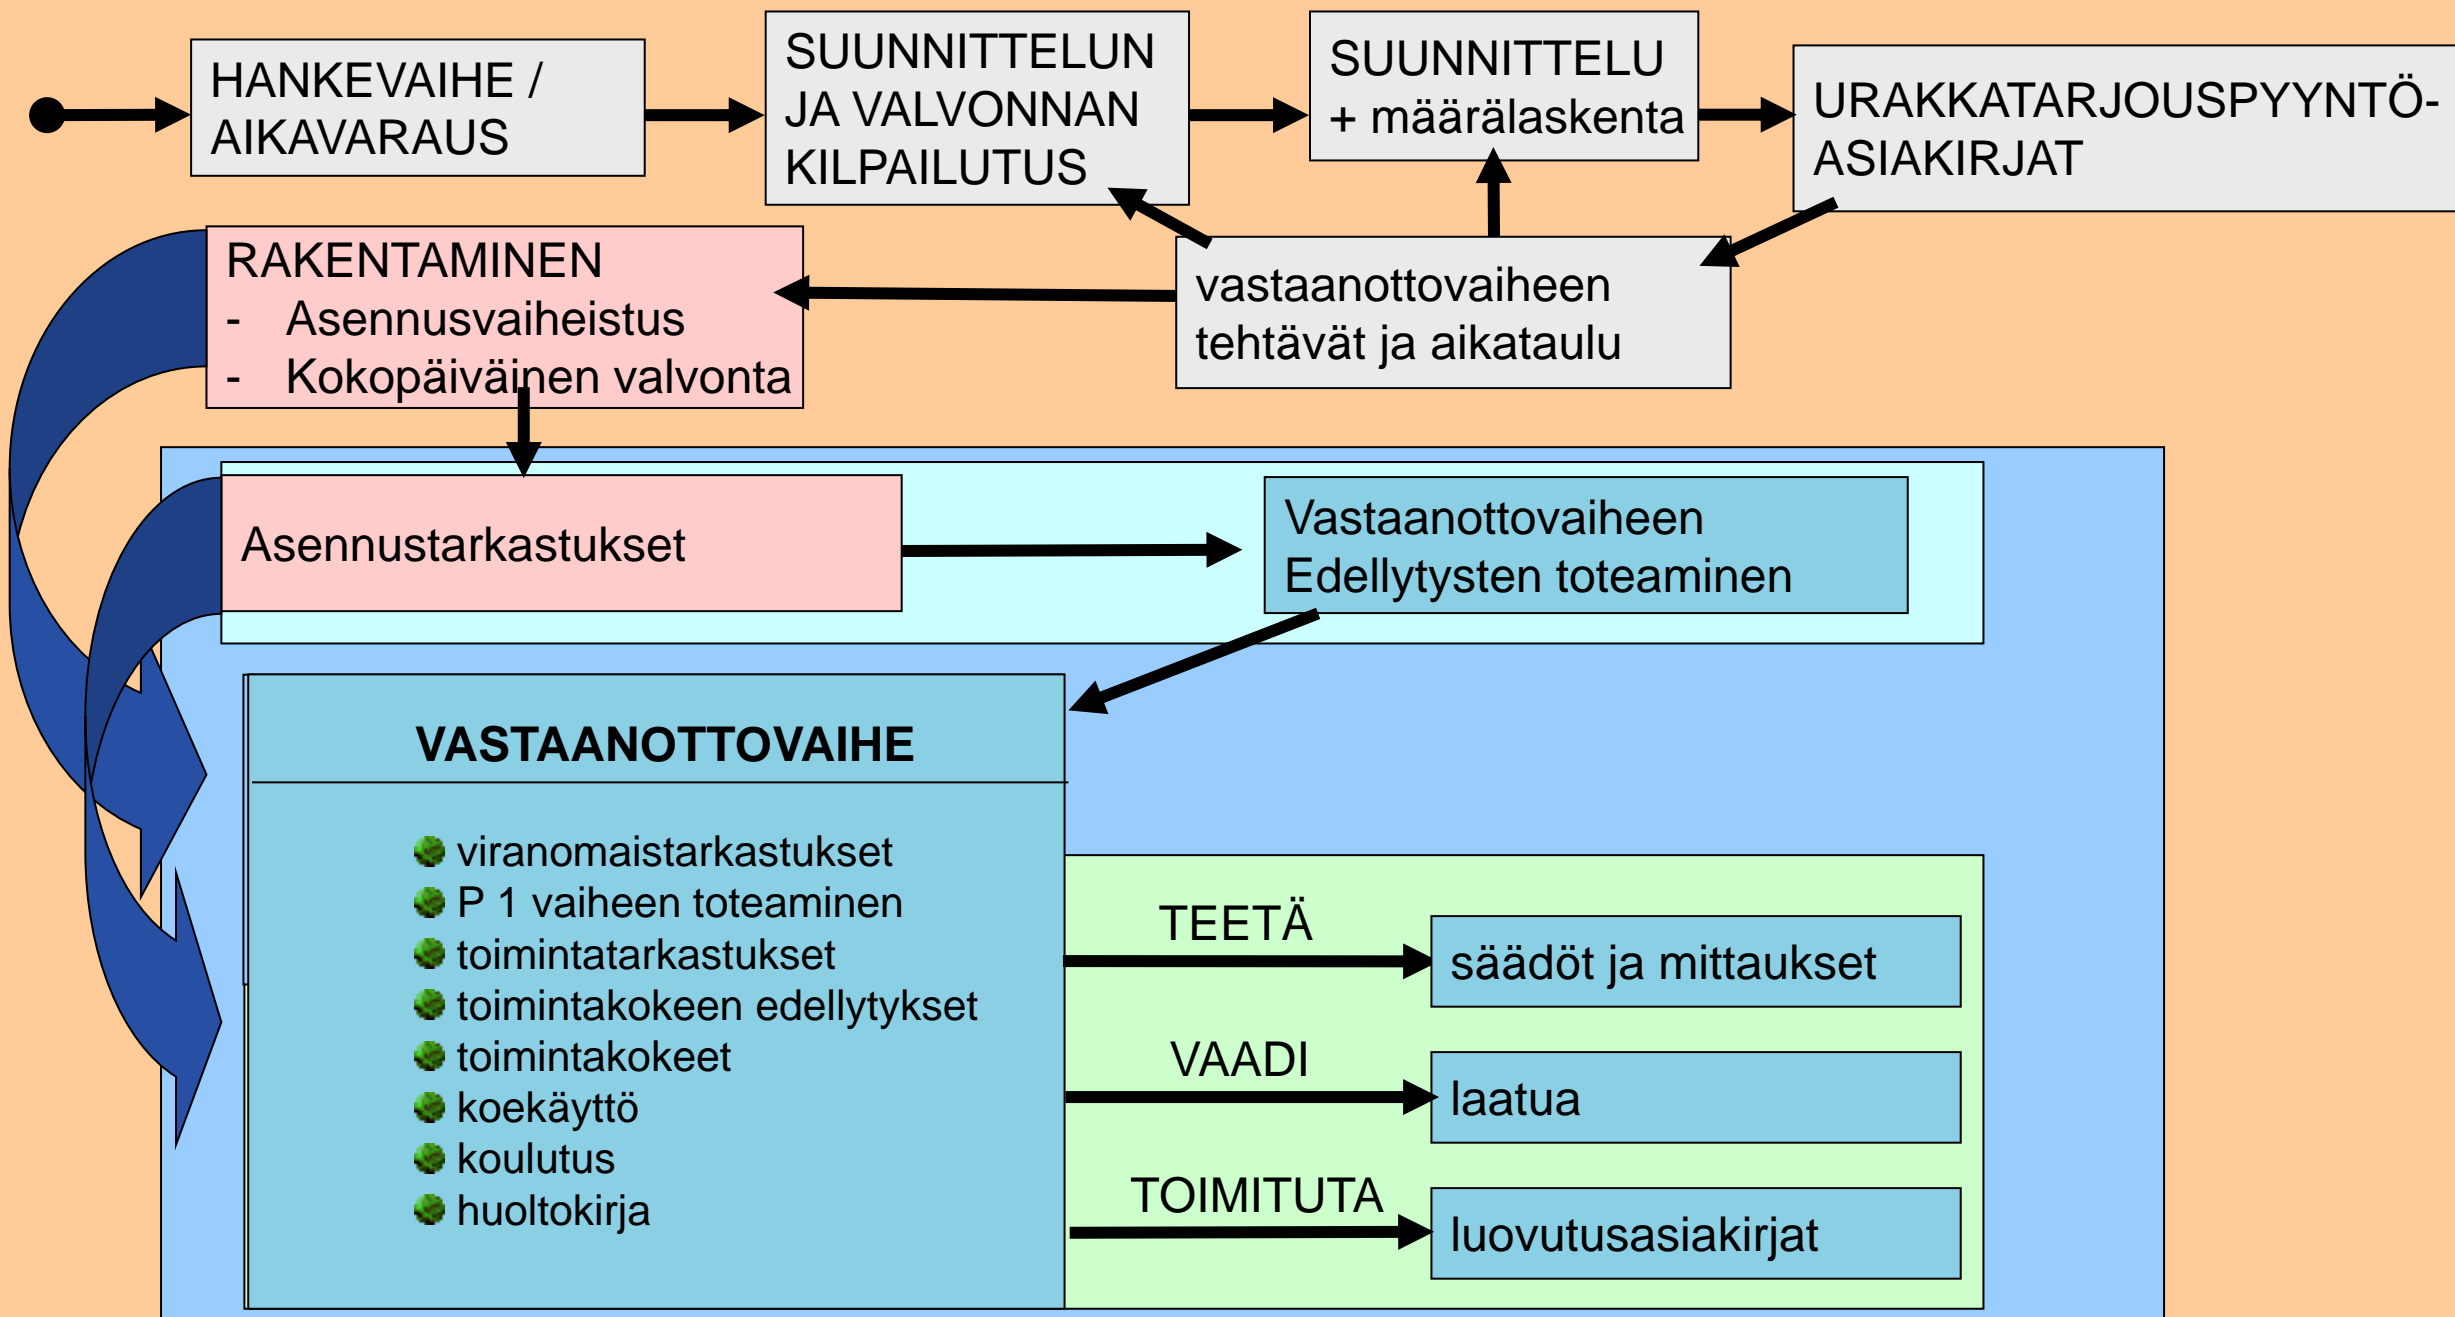

VASTAANOTTOVAIHEEN LÄPIVIENNIN ONGELMIA

- *KAIKEN PAHAN ALKU JA JUURI, KUN ENSIMMÄISENÄ PÄÄTETÄÄN AUKAISUAJANKOHTA.*
- *VASTAANOTTOVAIHEEN SUUNNITELMAT PUUTTUVAT*
- *P 1 KOULUTUSTILAISUUTTA EI PIDETÄ.*
- *KAIKKIEN URAKOITSIJOIDEN PITÄÄ TÄYTTÄÄ KÄYTÖNOPASTUS - JA KOULUTUSVELVOLLISUUS.*
- *URAKOITSIJAT JÄÄVÄT JÄLKEEN AIKATAULUSTA, SITTEEN LOPPUVAT RAHAT JA TULEE KIIRE LUOVUTTA KOHDE.*
- *URAKOITSIJOIDEN TYÖAIKAISET VASTUUHENKILÖT PITÄÄ SITOUTTAA MYÖS VASTAANOTTOVAIHEESEEN.*

VASTAANOTTOVAIHE

- TOIMINTAKOKEIDEN ALOITUSKOKOUS
- TOIMINTAKOKEET
- MITTAUKSET JA SÄÄDÖT
- KOEKÄYTTÖ
- VASTAANOTTO

Vastaanottovaihe		Uimahall mallipohja	Vastaanottovaihe	Vastaanottovaihe: 24.01.2011	VOV kesto: 5	VO kesto: 6	Muokkaa	Tulosta	28.09.2011 18.39	Kirjautu ulos	
Vuosi: 2011	Keskiviikko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vikko:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Päivä:	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
Leikää vuosi toimenpiteille	Vikopäivät:	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su	Ma	Ti	Ke
		Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su	Ma	Ti	Ke
<input type="checkbox"/> MALLIASIAKIRJA KESKIKOKOISELLE UIMAHALLILLE (1)											
<input type="checkbox"/> YHTEISET TOIMINTAPITEET (2)											
<input type="checkbox"/>	1	24.01.2011	24.01.2011	B0							
<input type="checkbox"/>	1	31.01.2011	31.01.2011	B1							
<input type="checkbox"/>	1	31.01.2011	31.01.2011	B2							
<input type="checkbox"/>	1	31.01.2011	31.01.2011	B3							
<input type="checkbox"/>	22	24.01.2011	22.02.2011	B4							
<input type="checkbox"/>	4	21.02.2011	24.02.2011	B5							
<input type="checkbox"/>	1	01.03.2011	01.03.2011	B6							
<input type="checkbox"/>	1	25.02.2011	25.02.2011	B7							
<input type="checkbox"/>	1	23.02.2011	23.02.2011	B8							
<input type="checkbox"/>	3	20.02.2011	02.03.2011	B9							
<input type="checkbox"/>	2	01.03.2011	02.03.2011	B10							
<input type="checkbox"/>	3	20.02.2011	02.03.2011	B11							
<input type="checkbox"/>	1	03.03.2011	03.03.2011	B12							
<input type="checkbox"/> RAKENNUSTYÖT (22)											
<input type="checkbox"/>	2	31.01.2011	01.02.2011	C0							
<input type="checkbox"/>	3	25.01.2011	04.02.2011	C1							
<input type="checkbox"/>	2	15.02.2011	16.02.2011	C2							
<input type="checkbox"/>	1	14.02.2011	14.02.2011	C3							
<input type="checkbox"/> VEDENKÄSITTELYTYÖT (53)											
<input type="checkbox"/>	3	26.01.2011	04.02.2011	D0							
<input type="checkbox"/>	1	04.02.2011	04.02.2011	D1							
<input type="checkbox"/>	10	04.02.2011	17.02.2011	D2							
<input type="checkbox"/>	16	01.02.2011	22.02.2011	D3							
<input type="checkbox"/>	2	25.01.2011	26.01.2011	D4							
<input type="checkbox"/>	1	26.01.2011	26.01.2011	D5							
<input type="checkbox"/>	7	26.01.2011	03.02.2011	D6							
<input type="checkbox"/>	2	16.02.2011	17.02.2011	D7							
<input type="checkbox"/>	5	14.02.2011	18.02.2011	D8							
<input type="checkbox"/>	4	11.02.2011	16.02.2011	D9							
<input type="checkbox"/>	1	21.02.2011	21.02.2011	D10							
<input type="checkbox"/>	2	28.02.2011	01.03.2011	D11							
<input type="checkbox"/> ILMANVAIHTOTYÖT (75)											
<input type="checkbox"/>	1	24.01.2011	25.01.2011	E0							
<input type="checkbox"/>	1	25.01.2011	25.01.2011	E1							
<input type="checkbox"/>	2	25.01.2011	26.01.2011	E2							
<input type="checkbox"/>	1	26.01.2011	26.01.2011	E3							
<input type="checkbox"/>	1	27.01.2011	27.01.2011	E4							
<input type="checkbox"/>	1	25.02.2011	25.02.2011	E5							
<input type="checkbox"/>	2	27.01.2011	28.01.2011	E6							
<input type="checkbox"/>	4	24.01.2011	27.01.2011	E7							
<input type="checkbox"/>	12	01.02.2011	16.02.2011	E8							
<input type="checkbox"/>	4	14.02.2011	17.02.2011	E9							
<input type="checkbox"/>	2	14.02.2011	17.02.2011	E10							
